Processo	Progettazione	
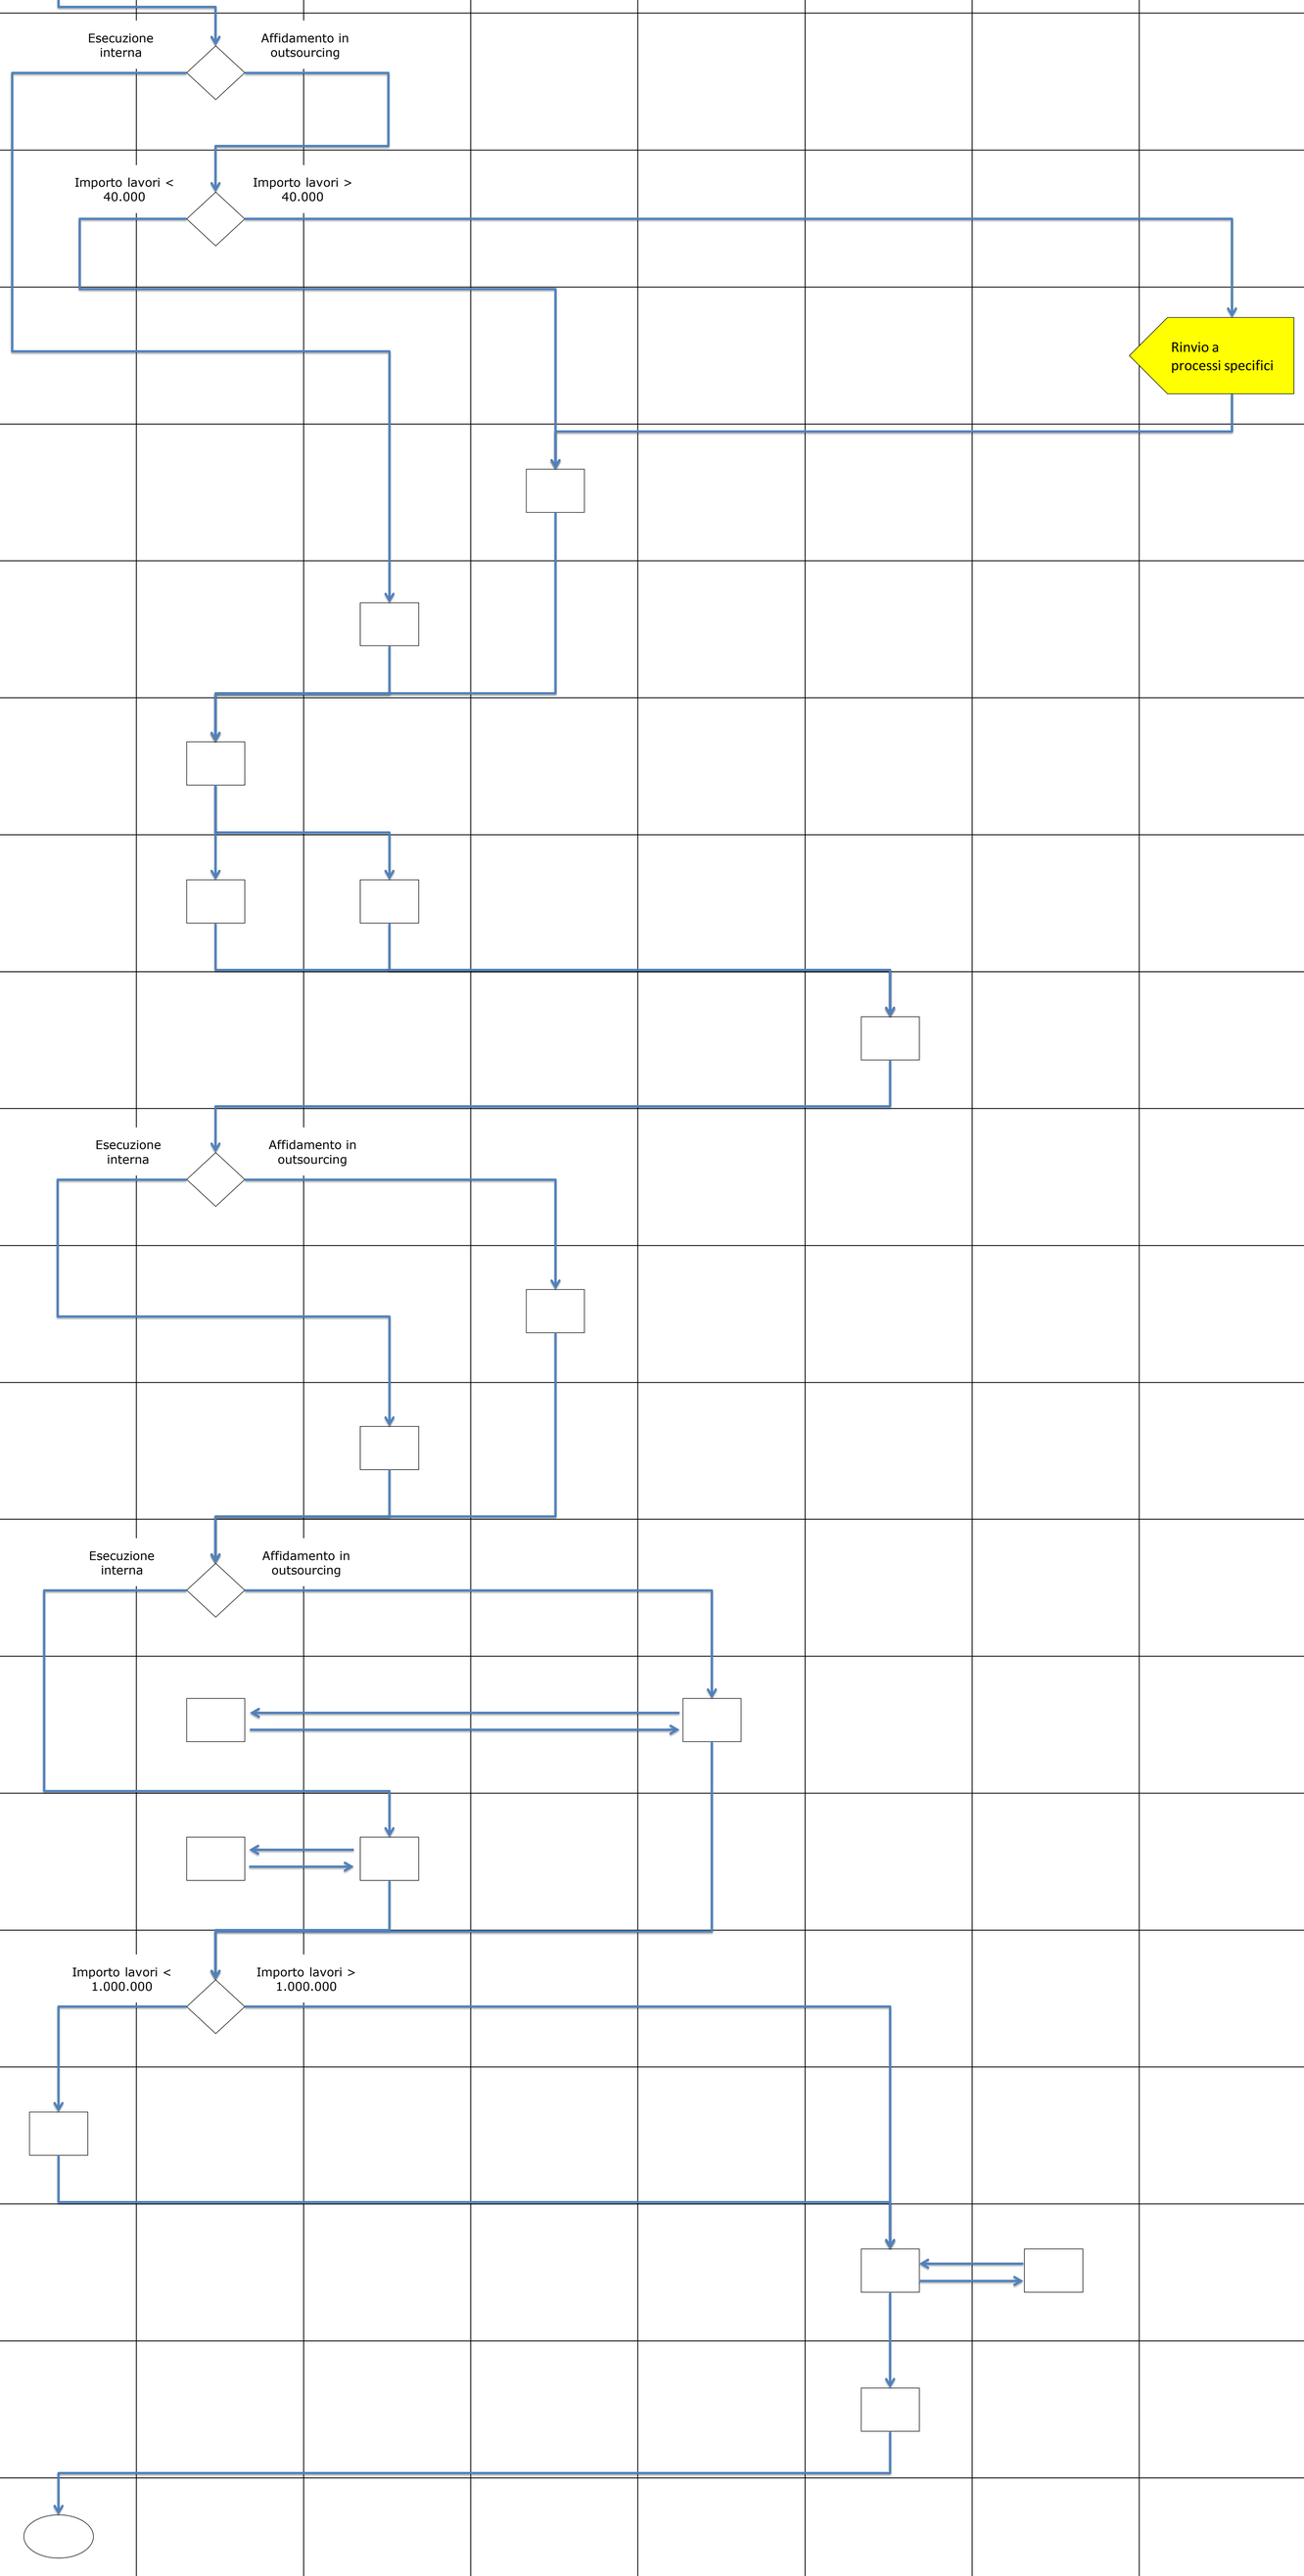
n.	ATTORI / ATTIVITA'	Dirigente Area Edilizia	RUP	Team di progettazione	Società esterna	Società esterna accreditata alla verifica	CdA	CTA	Centrale Acquisti	NOTE
1	Nomina RUP									L'avvio tiene conto delle procedure di analisi delle esigenze, della fattibilità tecnico economica del Tavolo tecnico AE e della decisione direzionale e politica
2	Definizione del team di progettazione									Il team è proposto dal RUP e nominato dal Dirigente con DD
3	Valutazione della tipologia di intervento che deve essere eseguito e definizione dello studio di fattibilità e del Documento Preliminare alla Progettazione DPP									DPP = Documento Preliminare alla Progettazione
4	Valutazione della eseguibilità interna dei due livelli di progettazione successivi all'interno della Area Edilizia o ricorso a servizi esterni di ingegneria e architettura									Proposta del RUP - Valutazione del Dirigente AE con decisione assunta con DD
5	DECISIONE: esecuzione interna o affidamento in outsourcing									
6	DECISIONE: per affidamento in outsourcing, lavori sotto € 40.000 o sopra									
7	Selezione e affidamento a società esterna									
8	Sviluppo del progetto definitivo									
9	Sviluppo del progetto definitivo									
10	Sottomissione del progetto agli Enti preposti al rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni (RIENTRO QUI DAL SERVIZIO IN OUTSOURCING)									Comuni, Genio Civile, VVF, Soprintendenza, …
11	Recepimento nel progetto definitivo/esecutivo O INVIO DEI PARERI ETC ALLA SOCIETA' IN OUTSOURCING									Nel recepimento si apportano le modifiche eventuali richieste dagli Enti e si modifica il quadro economico in aderenza all'esito del progetto
12	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto definitivo su proposta del RUP									Il progetto definitivo in approvazione al CdA recepisce le eventuali modifiche/adeguamenti richiesti dagli Enti, elaborate dal team di progetto o dalla Società scelta per affidamento in outsourcing
13	esecuzione interna o affidamento in outsourcing									
14	Redazione del progetto esecutivo									
15	Redazione del progetto esecutivo									
16	SE progetto di particolare complessità, verifica e validazione del progetto esecutivo in outsourcing									Il RUP non partecipa alla progettazione del team; verifica quindi la coerenza del progetto esecutivo alle esigenze e pareri etc ottenuti. Può scegliere di rivolgersi a società accreditate per particolare complessità o per valore dell'opera, secondo art. 26 DLgs 50/2016
17	Verifica e validazione del progetto esecutivo in outsourcing									
18	Verifica e validazione del progetto esecutivo internamente									
19	SE importo lavori < € 1.000.000									Sotto il milione di €, provvede il Dirigente dell'AE all'approvazione degli atti tecnici; sopra, provvede il CdA previo poarere del CTA-Comitato Tecnico Amministrativo
20	Approvazione del progetto esecutivo									
21	Approvazione del progetto esecutivo									
22	Indizione della gara di appalto in CdA, precisando tipologia di affidamento per la scelta del contraente									
23	FINE
